

# OXELVÄGENS FÖRSKOLA

## Nyhetsbrev

Projektet är i full produktion och följer tidsplanen

Under juni pågår arbeten med stommen som planeras vara rest när projektet tar semester vecka 28. Semestern pågår till och med vecka 31. Efter semestern fortsätter arbeten med sockel, dränering och markarbeten. Under vecka 34 påbörjas fönstermontage och planen är att ha "Tätt hus" vecka 36.

Efter detta görs arbeten inne i huset.

Byggets etableringsplats flyttas och placeras vid vändzonen som byggs ut. Den nya platsen kommer användas under nästa etapp med inre arbeten i huset och för de markarbeten som är kvar.




## Lokalgatan

I direkt anslutning till den nya förskolan bygger vi en ny lokalgata med platser för lämning och hämtning av barn samt transporter till förskolan. Arbetet går som planerat och nu schaktas det för VA och el och det byggs en ny trottoar och en transformator. Arbetet pågår under hösten. Vår högsta prioritet är alltid säkerheten. Vi är medvetna om att det är svårt att hitta P-plats men vi hoppas på er förståelse och hjälp.

### Har du en fråga om projektet kontakta projektledningen:

Projektledare, Nacka kommun  
Javier Vicente, 08-718 93 53  
javier.vicente@nacka.se

Platschef, NCC  
Niklas Hemmalin, 08-585 51 000  
niklas.hemmalin@ncc.se

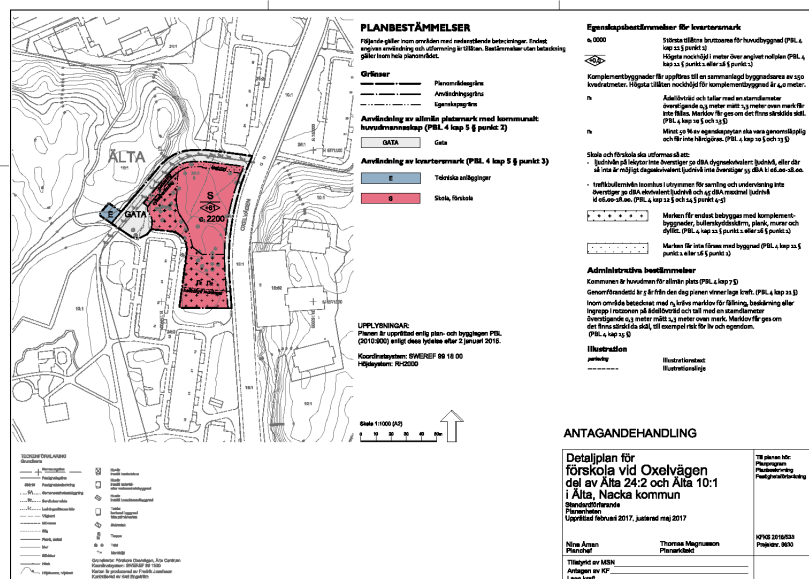

Nybyggnationen av Oxelvägens förskolan görs av Nacka kommun i samverkan med NCC. Projektorganisationen utgörs av lika delar representation från Nacka kommun och NCC. "Det innebär att starkt lokalt engagemang kombineras med kraftfulla resurser."

