Karta över befintliga skyddsrum



0 25 50 75 100 m

Datum:
Utförd av: Andrée Pettersson Ahlm
Kontaktuppgifter: +46752404235, andree.pettersson.ahlm@presto.se

SKYDDSRUMSINVENTERING

NACKA KOMMUN

STRANDPARKENS SKOLA FLÄDERVÄGEN 4 ÄLTA

TYP 2 - NSKR

Nacka Älta 20:1 Flädervägen 4 117217-2



PROJEKTINFORMATION

I UPPDRAGET GIVNA UPPGIFTER

Kommun	Nacka
Tätort	Nacka
Fastighetsbeteckning	Älta 20:1
Skyddsrumsnummer	117217-2

00B UPPGIFTER SOM SKA KONTROLLERAS ELLER KOMPLETTERAS.

Skyddsrummet finns	ja
Gatuadress vid ingång till skyddsrummet	Flädervägen 4

Skyddsrummets koordinater i SWEREFF 99 TM

N=	
E=	
nedre plan	
Skyddsrum är av typ A6/S3	nej
Utrymmet är ett splitterskyddsrum	nej
Typ av luftrening	sandfilter
Modernisering av komponenter har skett	nej
Skjutbart väggelement finns	nej
Stålstomme med synliga balkar och pelare finns	nej
Antal skyddsplatser E enligt skyddsrumsregistret	50
Inventeringsdatum	
Utfört av	Presto
Godkännandedatum	
Övrig information	

INLEDNING

SYFTE

Syftet med skyddsrumsinventeringen är att kontrollera skyddsrummets olika funktioner samt inventera skyddsrumsmaterial.

KONTROLLTILLFÄLLE

Skyddsrumsinventering har genomförts av Andrée Pettersson Ahlm.

SKYDDSRUMSINVENTERING

GENOMFÖRANDE

Skyddsrumsinventeringen har genomförts mot en checklista framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

NOTERINGAR

Nedan presenteras de identifierade bristerna som konstaterades vid skyddsrumsinventeringen inom Älta 20:1, Skr-nummer: 117217-2.

SKYDDSRUMSFUNKTION

Nr	Typ	Notering
1	**01c-1**	*Iordningställanderitning saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny iordningställanderitning skall upprättas. Se typlösning T01-101. **TILLÄGGSTEXT:** 1

SKYDDSDÖRR

Nr	Typ	Notering
1	**03å-1**	*Dörr till permanent luftsluss i ej splitterskyddat läge är inte betongfylld.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **ÅTGÄRD:** Dörrblad igjutes enligt typlösning T03-304. 
2	**03ae-1**	*Tätningslist till stötupptagande gummilist är defekt eller saknas.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **ÅTGÄRD:** Ny tätningslist skall monteras. Se typlösning T03-101. 
3	**03af-2**	*Stötupptagande list är inte fastlimmad längs hela dörrbladet.* **MÄNGD/ANTAL:** 1

ÅTGÄRD: Stötupptagande list skall limmas fast. Se typlösning T03-101.



GASTÄT DÖRR

Nr	Typ	Notering
1	**04u-2**	*Tätningslist är defekt eller saknas.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **ÅTGÄRD:** Ny tätningslist skall anskaffas och förvaras i en tät förpackning. Se typlösning T04-101. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ).
2	**04u-3**	*Tätningslist är förvarad i talk.* **ÅTGÄRD:** Tätningslist skall förvaras i tät förpackning utan talk. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T04-101.

IGENSÄTTNING FÖR RESERVUTGÅNG

Nr	Typ	Notering
1	**08g-1**	*Betongelement, fördelningsbalk, skruvar, muttrar och träkilar är ej demonterade.* **ÅTGÄRD:** Betongelement, fördelningsbalk, skruvar, muttrar och träkilar skall demonteras och placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T08-101. 

GENOMFÖRING MED SKYDDSPLÅT

Nr	Typ	Notering
1	**09f-1**	*Skruvar och muttrar är ej rengjorda och smorda.* **ÅTGÄRD:** Skruvar och muttrar skall rengöras och smörjas, provmonteras och läggas i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101. 
2	**09k-1**	*Tätningslist är defekt eller saknas.* **MÄNGD/ANTAL:** 2 **ÅTGÄRD:** Ny tätningslist skall anskaffas och förvaras i tät förpackning. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101.

		
3	**09I-1**	*Alla lösa komponenter är inte förvarade i skyddsrumsförrådet.* **ÅTGÄRD:** Alla lösa komponenter till genomföring med skyddsplåt lägges i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101.

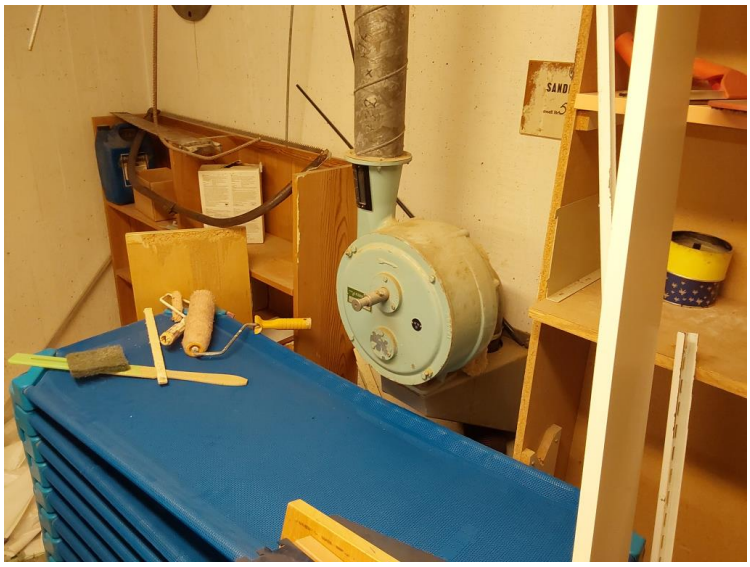
MONTERBAR PELARE

Nr	Typ	Notering
1	**11f-1**	*Monteringsskruv kärvar.* **MÄNGD/ANTAL:** 4 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
2	**11h-1**	*Monteringsstång passande hål i pelare saknas.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **ÅTGÄRD:** Monteringsstång enligt typlösning T11-108 anskaffas.

SKYDDSRUMSSTOMME

Nr	Typ	Notering
1	**12c-2**	*Stegjärn eller stege är defekt eller saknas i stigschakt.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen

VENTILATIONSAGGREGAT

Nr	Typ	Notering
1	**13c-1**	*Drifts- och skötselinstruktion saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny drifts- och skötselinstruktion skall anskaffas. Se typlösning T13-101. **TILLÄGGSTEXT:** 1
2	**13e-1**	*Vev för manuell drift saknas.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **ÅTGÄRD:** Ny vev skall anskaffas. Se typlösning T13-101. 
3	**13g-1**	*Ventilationsaggregat går trögt.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
4	**13j-1**	*Luftmängdsmätare saknas eller är defekt.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
5	**13m-4**	*Skyddsfilter är av typ sandfilter.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **ÅTGÄRD:** Sandfilter skall ersättas med nytt filter enligt typlösning T13-104.

ÖVERTRYCKSMÄTARE

Nr	Typ	Notering
1	**15a-1**	*Övertrycksmätare saknas, är skadad eller ej avläsbar.* **ÅTGÄRD:** Ny övertrycksmätare skall anskaffas. Se typlösning T15-101. **TILLÄGGSTEXT:** 1
2	**15b-1**	*Mätrör av metall saknas.* **ÅTGÄRD:** Nytt mätrör skall anskaffas. Se typlösning T15-101. **TILLÄGGSTEXT:** 1
3	**15b-2**	*Slang saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny slang skall anskaffas. Se typlösning T15-101. **TILLÄGGSTEXT:** 1
4	**15b-3**	*Vätska saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny vätska skall anskaffas. Se typlösning T15-101. **TILLÄGGSTEXT:** 1
5	**15c-1**	*Övertrycksmätare är inte förvarad i skyddsrumsförrådet.* **ÅTGÄRD:** Övertrycksmätaren förvaras tillsammans med mätrör inklusive tätning, slang och vätska i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ) i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T15-101. **TILLÄGGSTEXT:** 1
6	**15d-1**	*Genomföring för övertrycksmätare saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny genomföring skall anordnas enligt typlösning T15-102. **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
7	**15e-1**	*Skylt finns ej på insida vägg.* **ÅTGÄRD:** Skylt anskaffas och monteras på insida vägg enligt typlösning T15-101.

TOALETTUTRYMME

Nr	Typ	Notering
1	**16a-1**	*Toalettutrymme saknas.* **MÄNGD/ANTAL:** 2 **ÅTGÄRD:** Godkänt toalettutrymme skall anordnas. Se typlösning T16-101.
2	**16b-2**	*Plastväv till toalettutrymme saknas.* **MÄNGD/ANTAL:** 2 **ÅTGÄRD:** Ny plastväv skall anskaffas. Se typlösning T16-101.
3	**16b-3**	*Konsol till toalettutrymme av plastväv saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny konsol skall anskaffas. Se typlösning T16-101. **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen 
4	**16b-4**	*Infästning till toalettutrymme av plastväv saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny infästning skall anordnas enligt monteringsanvisningen. Se typlösning T16-101.
5	**16b-5**	*Monteringsanvisning till toalettutrymme av plastväv saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny monteringsanvisning skall anskaffas. Se typlösning T16-101.
6	**16c-1**	*Toalettkärl saknas eller är defekta.* **MÄNGD/ANTAL:** 2 **ÅTGÄRD:** Nya godkända plastkärl med lock skall anskaffas. Se typlösning T16-101.

7	**16d-1**	*Frånluftskanal eller direkt anslutning mellan toalettavdelning och luftsluss saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny frånluftskanal enligt typlösning T16-102 skall anskaffas och provmonteras. Frånluftskanalen märks med text ”Frånluftskanal”. Frånluftskanal inklusive infästningsanordningar förvaras i gemensam förpackning i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ).
8	**16e-1**	*Infästning av frånluftskanal är bristfällig.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
9	**16f-1**	*Frånluftskanal förvaras inte i skyddsrumsförrådet.* **ÅTGÄRD:** Frånluftskanal placeras i skyddsrumsförrådet. Frånluftskanal inklusive infästningsanordningar förvaras i gemensam förpackning i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T16-101.

TAPPSTÄLLE OCH GOLVBRUNN

Nr	Typ	Notering
1	**19b-1**	*Slang och strålrör med passande förskruvning saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny slang och strålrör med passande förskruvning skall anskaffas och provmonteras. Se typlösning T19-101. **TILLÄGGSTEXT:** Slang saknas
2	**19c-2**	*Avstängningsanordning i golvbrunn fungerar ej.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **ÅTGÄRD:** Avstängningsanordning skall sättas i funktion eller bytas ut. Se typlösning T19-101.
3	**19d-1**	*Golvbrunn kärvar.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **ÅTGÄRD:** Golvbrunn skall rengöras och ventilspindel infettas. Se typlösning T19-101.
4	**19e-1**	*Nyckel till golvbrunn saknas.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **ÅTGÄRD:** Nyckel till golvbrunn införskaffas och placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T19-101. 

UPPVÄRMNING

Nr	Typ	Notering
1	**20c-1**	*Radiator saknar kompletterande fånganordning.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **ÅTGÄRD:** Radiator kompletteras med fånganordningar enligt typlösning T20-101. 

ELINSTALLATIONER

Nr	Typ	Notering
1	**21o-2**	*Läge på telegenomföring saknar skylt på utsida skyddsrumsvägg vid genomföringen.* **ÅTGÄRD:** Skylt skall uppsättas på utsida vägg vid genomföringen. Se typlösning T21-101. **TILLÄGGSTEXT:** 1

LUFTINTAG I SKYDDSRUMMET

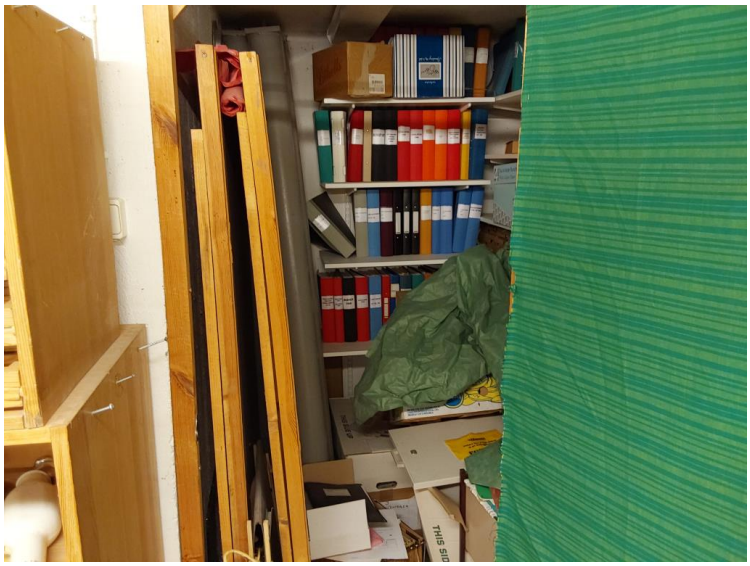
Nr	Typ	Notering
1	**22i-1**	*Rostskyddsbehandling av uteluftskanal är bristfällig.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
2	**22j-1**	*Infästning av uteluftskanalen är bristfällig.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
3	**22k-1**	*Genomföring saknas.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen

UTVÄNDIGT

Nr	Typ	Notering
1	**23a-1**	*Utvändigt stigschakt är av felaktig typ.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
2	**23b-1**	*Stegjärn eller stege är defekt eller saknas i stigschakt.* **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
3	**23c-1**	*Bristfällig infästning av stegjärn eller stege.* **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
4	**23d-1**	*Stegjärn eller stege är rostiga.* **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
5	**23f-1**	*Vatten i utvändigt stigschakt finns.* **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
6	**23g-1**	*Antenngenomförings läge saknar skylt på utsida.* **ÅTGÄRD:** Skylt för antenngenomförings läge skall uppsättas på utsida. Se typlösning T23-101.
7	**23h-1**	*Uteluftskanal mynnar ej i det fria.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
8	**23i-1**	*Uteluftskanal är inte utförd av stålrör.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
9	**23j-1**	*Uteluftskanal är ej rensad.* **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
10	**23k-1**	*Rostskyddsbehandling av målad uteluftskanal är bristfällig.* **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
11	**23l-1**	*Skruv är ej åtdragen.* **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
12	**23m-1**	*Uteluftskanalens öppning är placerad på mindre avstånd än 1,0*

		meter över mark. **MÄNGD/ANTAL:** 1 **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
13	**23n-1**	*Uteluftskanalens öppning saknar nät.* **TILLÄGGSTEXT:** Ej kontrollerbart vid inventeringen
14	**23o-1**	*Demonterbar uteluftskanal saknas.* **ÅTGÄRD:** Ny uteluftskanal skall anskaffas. Se typlösning T23-101.

SKYDDSRUMSFÖRRÅD

Nr	Typ	Notering
1	**24d-1**	*Annan utrustning än utrustning till aktuellt skyddsrum finns i skyddsrumsförrådet.* **ÅTGÄRD:** Sådant som inte tillhör skyddsrummet skall avlägsnas från skyddsrumsförrådet. Se typlösning T24-101. 

UTRUSTNING I SKYDDSRUMSFÖRRÅDET

Nr	Typ	Notering
1	**25a-1**	*All lös utrustning är inte förvarad i skyddsrumsförrådet.* **ÅTGÄRD:** Följande utrustning, befintlig eller anskaffad, skall placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T25-101.
